



ASSOCIATION BANG-N-TUM

TEL: (00226) 24 55 44 60

BP: 143 Ouahigouya-Burkina Faso

Email: associationburkinabedeshandicape@yahoo.fr

Chevalier de l'ordre de mérite burkinabé agrafe sociale.



Ouahigouya le 09 mai 2022

Réf. 2022/014 /ABNT/SE/OHG

Le Président

A

Isabelle Chevalley

Objet : *Rapport d'activités*

J'ai le plaisir de vous faire parvenir les rapports du projet de réhabilitation des latrines au niveau du siège de l'ABNT/N.

Ci-joint :

- Le rapport technique*
- Le rapport financier*

Je vous prie d'agréer, l'expression de ma profonde gratitude.

Le Président



ZANGO Boucari
Chevalier de l'Ordre du Mérite



ASSOCIATION BANG-N-TUM

TEL: (00226) 24 55 44 60

BP: 143 Ouahigouya-Burkina Faso

Email: associationburkinabedeshandicape@yahoo.fr

Chevalier de l'ordre de mérite burkinabé agrafe sociale.

Nom de l'organisation :


Association Bang-N-Tum des
personnes handicapées (ABNT)

Titre du projet :

Réhabilitation des latrines

Période couverte par le rapport :

1^{er} Février 30 Avril 2022

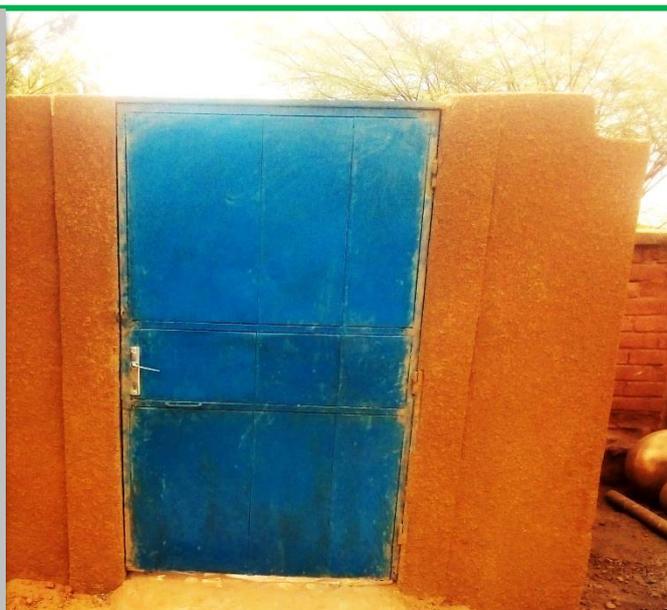

RAPPORT DE REHABILITATION DES LATRINES

Mai 2022



Introduction.

Dans le cadre de ses activités l'Association Bang-N-Tum des personnes handicapées de Ouahigouya a bénéficié d'une subvention d'un montant de cinq cent vingt mille (520 000) francs CFA la réhabilitation des latrines public situées dans l'enceinte du siège de l'association au profit de ses membres ainsi que les autres usagers de la cour. Ce projet a été financé par Isabelle CHEVALLEY.

Le présent rapport donne une situation des réhabilitations réalisées dans le cadre de ce projet et s'articule autour des points suivant :

- Un rapport narratif
- Un rapport financier

SITUATION DES REALISATIONS

CONSTRUCTION

Le projet de réhabilitation des latrines a vu le jour suite à un constat de la mauvaise qualité de ces lieux d'aisance qui faute de moyens financiers étaient devenus à la limite une source de maladies pour les usagers sans oublier les risques d'effondrement des dalles qui présentaient un état de dégradation avancé.

Le financement a permis la réhabilitation complète d'un ouvrage adapté aux conditions Physiques des personnes vivant avec un handicap.

- **Date de démarrage des travaux**

Pour assurer un bon déroulement des travaux, un comité de gestion a été mis en place pour suivre l'ensemble des travaux sous la supervision de l'équipe technique de ABNT/N.

Les travaux ont démarré le 15 Avril par l'identification des prestataires, la collecte des agrégats (sables, gravier). Les travaux ont été confiés à l'association Minemnooma qui nous avait fourni le devis estimatif.

Consistance des travaux

- La récupération des trous qui consistait les curer et à les stabiliser et à confectionner de nouvelles dalles
- La récupération des portes consistait à réparer les parties rongées par la rouille à changer les serrures et à renouveler la peinture
- la récupération des mur a consisté à faire une l'enduit externe et interne et de consolider cela avec de la tyrolienne.
- La transformation du deuxième poste en douche
- La couverture du planché des deux postes avec du carreau cassé

- L'adaptation des toilettes ainsi que la douche
- Tous ces travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions techniques demandées

Modifications

Une sorte de baignoire a été ajoutée au niveau de la douche. L'idée est de faire également une adaptation pour permettre aux PVH d'avoir accès à cet espace sans être obligés de ramper. Nous avons donc une partie pour le handicapé et un autre pour ceux qui ne sont pas obligés de ramper. Au niveau du WC, la barre a été délaissée à la demande des usagers.

- **difficultés rencontrées,**

L'exécution des travaux n'a pas rencontré de difficultés particulières même s'il faut noter que l'acquisition des carreaux cassés de qualité a pris un certain temps ce qui a occasionné un léger retard par rapport à nos prévisions.

- **Date d'achèvement des travaux** La réception a été prononcée le 30 Avril 2022 soit un peu plus de deux mois après le début des travaux.

ANNEXES

Photos des réalisations

PHOTOS DES REALISATIONS



RAPPORT FINANCIER



Nom du bénéficiaire	Association Bang N Tum
Nom du projet	Rehabilitation des latrines
Période du rapport	Février – avril 2022
Contact du bénéficiaire	Association Bang N Tum Tel: +226 24 55 44 60 / 72 71 07 00 Email: associationburkinabedeshandicape@yahoo.fr
Contact du président de l'Association	ZANGO Boucari Tel : +226 78 80 26 09/72 71 07 00

INTRODUCTION

Le présent rapport financier couvre la période du 01 février au 30 avril 2022 et rend compte de l'exécution financière dans le cadre du projet de réhabilitation des latrines conformément à la convention de financement.

Etat d'exécution financière des activités

Subvention reçue	:	5 20 000
Montant des dépenses réalisées	:	520 000
Taux d'exécution	:	100 %

ETAT DES DEPENSES TOTALES

DATE	N° PIECE	LIBELLE	ENTREE	SORTIE	SOLDE
17-jan. 22			520 000		520 000
29-avr.22	1.	Vidange fosse		30 000	490 000
29-avr.22	2.	Récupération portes		15 000	460 000
29-avr.22	3.	Dalle		30 000	430 000
29-avr.22	4.	Ciment réparation du trou		5 000	415 000
29-avr.22	5.	Ciment enduit des murs		5 000	385 000
29-avr.22	6.	Ciment pour chape		5 000	360 000
29-avr.22	7.	Sable		30 000	330 000
29-avr.22	8.	Gravier		30 000	300 000
29-avr.22	9.	Main d'œuvre		100 000	200 000
29-avr.22	10.	Adaptation		100 000	100 000
29-avr.22	11.	Divers (carrelage, plomberie)		100 000	0

Conclusion et perspectives

Le niveau de consommation du budget est maintenant de 100 %. ABNT à apporter une contribution en nature pour faire face aux petites dépenses.

Visa du président de ABNT/N

Je soussigné ZABGO Boucari, président de l'association Bang n Tum (ABNT/N), certifie que j'ai connaissance de ce rapport financier ; que les informations fournies dans le présent rapport sont exactes.

ZANGO Boucari

Ouahigouya le 29 avril 2022



PIECES JUSTIFICATIVES

Association Minemnooma

B.P. 381 OHG ☎ 40 55 03 27 : 63 67 26 91 E-Mail: minemnoom@yahoo.com

FACTURE

Facturer à : Association Bang n Tum BP 43 Ouahigouya

Pour les travaux de réhabilitation des latrines

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1	Vidange fosse	FF	1	30 000	30 000
2	Récupération portes	U	2	15 000	30 000
3	Dalle	FF	1	30 000	30 000
4	Ciment réparation du trou	Sac	3	5 000	15 000
5	Ciment enduit des murs	FF	6	5 000	30 000
6	Ciment pour chape	FF	5	5 000	25 000
7	Sable	Voyage	1	30 000	30 000
8	Gravier	Voyage	1	30 000	30 000
9	Main d'œuvre	FF	1	100 000	100 000
11	Adaptation	FF	1	100 000	100 000
12	Divers (carrelage, plomberie)	FF	1	100 000	100 000
TOTAL					520 000

Arrêté la présente facture à la somme de cinq cent vingt mille francs CFA

Ouahigouya le 29 ARIL 2022

Pour acquit par cheque
 N° 3982722 du 29/04/22
 Ganame L. Pascal
 CNIB n° 10663847
 du 02/01/2018 ONI Ouaga
 Tel. 70 2940 63

LE COMPTABLE



GANAME P. Pascal

