



Rapport du "Projet Reboisement et économie locale" au Burkina Faso

Financement : FONDATION VITOL/Suisse

Table des matières

Sigles et abréviations

Remerciements du Secrétaire Exécutif

A. Rapport Physique

I. Analyse du contexte dans lequel s'est déroulé le projet

II. Description des activités à mettre en œuvre

III. Résultats obtenus

IV. Difficultés rencontrées

V. Conclusion

B. Rapport financier

VI. Bilan financier

VII. Fiche de classification des pièces justificatives

VIII. Annexe

- **Photos**
- **Vidéos**
- **Copie des factures et autres pièces comptables**

SIGLES ET ABREVIATIONS

PDI : Personnes Déplacées Internes

H : Hôtes

DR : Direction Régionale

DP : Direction Provinciale

REMERCIEMENTS DU SECRETAIRE EXECUTIF

Toute l'équipe de l'ONG Burkina Vert et les communautés de base bénéficiaires du présent projet pilote qui tire vers sa fin à travers ma modeste voix vous remercie et l'ensemble de vos partenaires. Ce projet symbole d'une solidarité agissante pour un monde meilleur a permis de redonner de l'espoir à des couches vulnérables fragilisées, renforcer leur résilience, restaurer des écosystèmes menacés grâce à **l'Association Isabelle CHEVALLEY** au dynamisme et à l'humanisme de sa présidente et à la générosité de **la Fondation Vitol**.

Nous réitérons encore de vive voix nos remerciements et vous traduit encore toute notre gratitude.

Doudou Bagaya

A. Rapport Physique

I. ANALYSE DU CONTEXTE DANS LEQUEL S'EST DEROULE LE PROJET

La zone d'intervention du projet est confrontée à une dégradation progressive de ses ressources naturelles due à la pression démographique, aux effets des changements climatiques, à la déforestation et à des pratiques agricoles intensives. Cette situation affecte directement les moyens de subsistance des populations rurales, dont l'économie repose principalement sur l'agriculture, l'élevage et l'exploitation d'arbres fruitiers, notamment le manguier.

Ce projet a été conçu pour répondre à ces défis environnementaux et socio-économiques en plaçant les communautés locales au cœur de sa mise en œuvre. Il vise à créer des opportunités économiques et des emplois verts au niveau local, à renforcer les capacités des populations en matière de gestion durable des ressources naturelles et à contribuer à la réduction de la pollution.

Le présent rapport final du projet « Reboisement et économie locale au Burkina Faso » rend compte d'une initiative visant à renforcer la résilience des populations déplacées et des familles d'accueil grâce à une sylviculture innovante et durable. Le projet a permis aux bénéficiaires de développer, à court terme, des plantations d'espèces fruitières, principalement des manguiers, combinées à des activités de maraîchage destinées à améliorer la sécurité alimentaire. À moyen et long terme, ces actions contribueront également à la séquestration du carbone et à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques.

La mise en œuvre du projet a nécessité la réalisation de plantations, la construction d'infrastructures hydrauliques, l'acquisition d'équipements ainsi que le renforcement des capacités des communautés bénéficiaires à travers des formations, des actions de sensibilisation et un accompagnement technique régulier.

Le projet s'est déroulé dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, notamment dans des zones d'accueil de personnes déplacées internes ayant fui des régions particulièrement touchées par l'insécurité.

Le projet s'articule autour de deux volets stratégiques :

1er volet : Renforcement de la résilience des communautés bénéficiaires
Ce volet vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et à favoriser le développement de microentreprises rurales, notamment par la transformation des mangues par des groupements de femmes (jus, confitures et mangues séchées).

2ième volet : Contribution à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre
Ce volet vise à renforcer les capacités locales en matière de reboisement et de gestion durable des ressources naturelles, contribuant ainsi à la réduction des émissions et à la séquestration du carbone.

II. DESCRIPTION DES ACTIVITES MISES EN ŒUVRE

Activités réalisées	Nombre	Bénéficiaires, Nombre et types
Acquisition de plants de manguiers	6 500	300
Acquisition points d'eau positifs (forages équipés de Panneaux photovoltaïques et château)	03	90 femmes soit 30 femmes par site
Acquisition de moyens roulants pour l'arrosage	02	Site du projet
Acquisition de matériels d'arrosage - Futs (400L) - Bidons (20L)	 03 30	Site du projet
Formations (un responsable par site d'un hectare)	03 sessions	05 responsables par site donc 15 au total
Sensibilisations	03 séances	Populations adultes des « villages bénéficiaires estimés à 12'000 habitants
Matériels pour trouaison et plantations - Barre à mines - Pioches - Gants (paires) - Bottes	 04 04 04 04	300
Gardiennage 03 ans	03	Gardien
Suivis-supervision 03 ans	01	Équipe technique de Burkina Vert + service régionale des Eaux et Forets
Frais divers	01	Utilisé pour le transport des plantes

III. RESULTATS OBTENUS

Lieu du site			Plantation		Installation forage équipé	Aménagement + maraichage	Construction bassins	Observations
Province	Commune	Village	Superficie totale	Nombre d'arbres plantés	Nombre	Superficie totale	Nombre	La construction des bassins de rétention d'eau destinés à l'arrosage n'était pas initialement prévue dans le projet. Nous avons donc consulté les partenaires afin d'obtenir leur avis sur la possibilité de réaffecter la ligne budgétaire initialement prévue pour l'acquisition de taxis-motos, de fûts et de bidons. Toutefois, à la suite d'une assemblée générale réunissant les bénéficiaires, la nécessité et le caractère prioritaire de la réalisation de bassins de rétention sur les différents sites ont été clairement confirmés. Par ailleurs, afin de renforcer le gardiennage et le suivi régulier des sites, une mesure palliative a été mise en place. Nous avons ainsi mobilisé une partie de la ligne budgétaire consacrée aux frais divers, les montants initialement prévus s'étant révélés insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins sur les trois années du projet.
Yatenga	Namissiguima	Bagayalgo	3,5 ha	2 200	01 forage équipé	02 ha	08	
	Ouahigouya	Kouri	3,5 ha	2 200	01 forage équipé	02 ha	08	
Zandoma	Boussou	Boussou	3,5 ha	2 200	01 forage équipé	02 ha	08	
TOTAL			**10,5 ha**	**6 600**	**03**	**06 ha**	**24**	

IV. DIFFICULTES RENCONTREES

Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée au cours de la mise en œuvre du projet. Les principaux ajustements ont concerné l'adaptation de certains postes budgétaires, ce qui est normal dans le cadre d'un projet pilote nécessitant des ajustements progressifs en fonction des réalités du terrain et des besoins identifiés avec les bénéficiaires.

Dans l'ensemble, la mise en œuvre du projet s'est déroulée dans de bonnes conditions et a suscité un fort engouement ainsi qu'une adhésion remarquable des communautés locales. Les bénéficiaires se sont fortement impliqués dans les différentes activités, notamment les travaux de plantation, l'entretien des sites et les actions de sensibilisation, témoignant ainsi de leur intérêt pour la durabilité du projet.

L'acceptation sociale du projet a été particulièrement encourageante. Plusieurs propriétaires terriens ont exprimé leur volonté de s'engager volontairement en mettant à disposition leurs terres pour la réalisation d'initiatives similaires à l'avenir. Cet engagement spontané constitue un indicateur très positif du potentiel de reproduction et d'extension du projet dans la zone d'intervention.

Cette dynamique locale confirme la pertinence de l'approche participative adoptée, fondée sur l'implication directe des communautés dans la conception et la mise en œuvre des activités. Elle laisse entrevoir de bonnes perspectives pour la pérennisation des acquis et le développement de projets similaires dans les années à venir.

V. CONCLUSION

Au terme de ce projet innovant, il ressort avant tout une forte appropriation des actions par les populations bénéficiaires, ainsi qu'une volonté clairement exprimée de voir les initiatives mises en œuvre se poursuivre et se dupliquer dans d'autres localités. L'implication active des communautés tout au long du projet a permis de renforcer leur compréhension des enjeux liés à la gestion durable des ressources naturelles et d'encourager des pratiques respectueuses de l'environnement, tout en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Le projet a démontré la pertinence d'une approche intégrée combinant reboisement, production fruitière et activités de maraîchage, contribuant à la fois à la sécurité alimentaire des ménages, à la création d'activités génératrices de revenus et à la restauration progressive des écosystèmes dégradés. Les résultats obtenus montrent que ce type d'initiative constitue une réponse concrète et adaptée aux défis posés par les changements climatiques et par la dégradation des ressources naturelles dans la zone d'intervention.

La Direction provinciale des Eaux et Forêts, qui a assuré le suivi technique du projet, a salué la qualité de la mise en œuvre par l'ONG Burkina Vert et a souligné la pertinence de cette initiative au regard du contexte actuel marqué par les effets de plus en plus visibles des changements climatiques et leurs conséquences sur les populations rurales.

Les acquis du projet constituent une base solide pour la poursuite et l'extension de ce type d'actions. L'expérience acquise et l'adhésion des communautés offrent des perspectives encourageantes pour le développement futur d'initiatives similaires, contribuant à renforcer durablement la résilience des populations locales face aux défis environnementaux et socio-économiques.

B. Rapport financier

VI. Bilan financier

Budget total reçu : 19 473 703 F CFA + 3 210 000 F CFA = 22 683 703 F CFA

Activités	Budgets prévus F CFA	Budget réalisé FCFA	Commentaires
Acquisition de plants de manguiers	2 730 000	2 925 000	Les prix des plants ont augmenté du fait que nous avons eu un retard au niveau du financement sur la planification originale.
Acquisition points d'eau positifs (forages équipés de Panneaux photovoltaïques et château)	11 550 000	14 760 000	Le retard au niveau du financement a occasionné une augmentation des prix du matériel. Cela est dû aussi à l'insécurité car il y a un manque du matériel souhaité. Après réajustement du budget au niveau des forages et châteaux, nous avons reçu un complément de 3 210 000 F CFA.
Acquisition de moyens roulants pour l'arrosage	2 380 000	2 380 000	Utilisé pour la construction des bassins de rétention d'eau et l'achat des tuyaux pour raccordement
Acquisition de matériels d'arrosage - Futs (400L) - Bidons (20L)	903 000	903 000	Utilisé pour la construction des bassins de rétention d'eau et l'achat des tuyaux pour raccordement
Formations (un responsable par site d'un hectare)	700 000	675 000	Après des échanges, nous avons mis place un comité par site composé de 05 personnes par site au lieu de former

			une personne par site. Après la formation nous avons eu un reliquat de 25 000 F et cette somme a été utilisée pour combler les lignes qui dépassaient le budget
Sensibilisations	490 000	495 000	Un dépassement de 5 000 F pour la location du matériel de sonorisation. En plus de cela ; nous avons pris contact avec le Service de l'Environnement qui a mis à notre disposition deux animateurs (H et F).
Matériels pour trouaison et plantations - Barre à mines - Pioches - Gants (paires) - Bottes	151 200	166 000	Il y a eu un dépassement de 14 800 F
Gardiennage 03 ans pour 03 sites	700 000	700 000	Burkina Vert est tenu de gérer cette somme périodiquement avant d'établir des factures annuelles
Suivi-supervision 3 ans	150 500	150 500	Burkina Vert est tenu de gérer cette somme périodiquement avant d'établir des factures annuelles
Frais divers	265 300	270 000	Utilisé pour la location/transport des plants sur les trois sites
TOTAL	**20 020 000**	**23 424 500**	

ORDRE DE CLASSIFICATION DES PIECES JUSTIFICATIVES.

N° d'ordre	Rubriques	Date dépense	Objet dépenses	Nom du fournisseur	Montant dépensé
01	Acquisition points d'eau positifs (forages équipés de panneaux photovoltaïques et château) Réalisation de bassins et achat tuyauterie	21/04/2025	Facture N°2025-037	Entreprise ETAPE/SONGO	18 023 250 F
02	Formation en gestion, entretien d'un verger et haie-vive	30/10/2025	Facture N°14/25	Centre ERED-SARL	675 000 F
03	Achat petits matériels	10/04/2025	Facture N° 01	Commerce Général	166 000 F
04	Acquisition de plants de manguiers	20/06/2025	Facture N°2025-015	PVPHS	2 925 000 F
05	Location camionnette pour transport plants	12/09/2025	Facture 2025-014	GARAGE WEND KONTA	270 000 F
06	Etat de payement Sensibilisation	06/02/2025	Etat de payement N°01	OUEDRAOGO Hamadé Agent Environnement	495 000 F
07	Gardiennage -suivi-supervision	----------	----------	Burkina Vert	850 500 F

XI. Annexes

- **Photos illustratives :**





REALISATION DES FORAGES





EQUIPEMENT DU CHATEAU





CHATEAU PRET A ETRE UTILISE





CONSTRUCTION DES BASSINS (deux modèles)





CREUSAGE DES TRANCHEES POUR LA CANALISATION AVEC LES BASSINS





CREUSAGE DES TRANCHEES POUR LA CANALISATION AVEC LES BASSINS





BASSINS FONCTIONNELS





CREUSAGE DES TROUS





CREUSAGE DES TROUS





LES FEMMES PRETENT POUR LE REBOISEMENT






LES PLANTS PRËTS POUR LE REBOISEMENT





TOP DEPART POUR LE REBOISEMENT



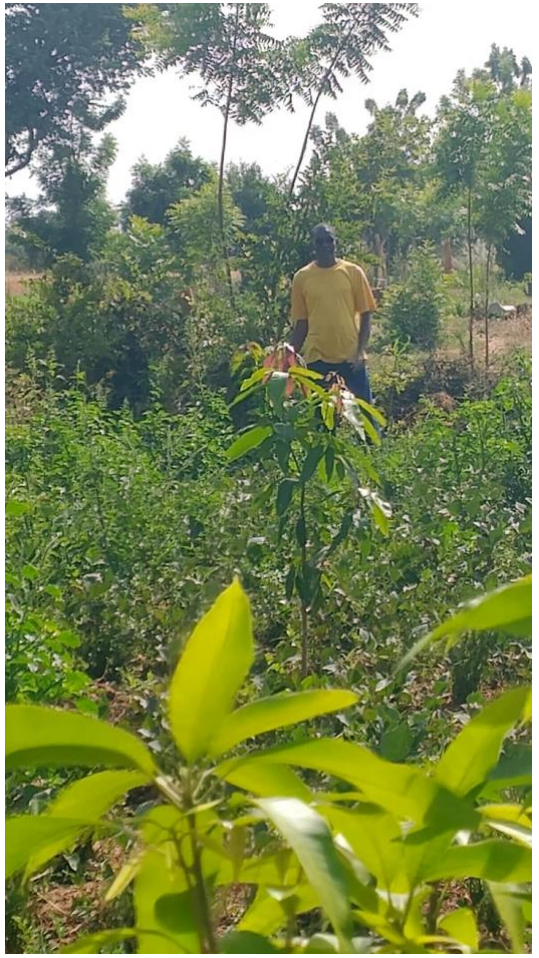

LA HAUTEUR ACTUELLE DES MANGUIERS

FORMATION/SENSIBILISATION :









Les sensibilisations sont faites la nuit avec des animations afin de pouvoir toucher le maximum de personnes.

NB : Les deux personnes qui ont fait les sensibilisations sont des Agents des Eaux et Forêts.
